


土与丸(是石)地区ほか配水管布設替工事施工箇所



配水管布設工箇所概略図

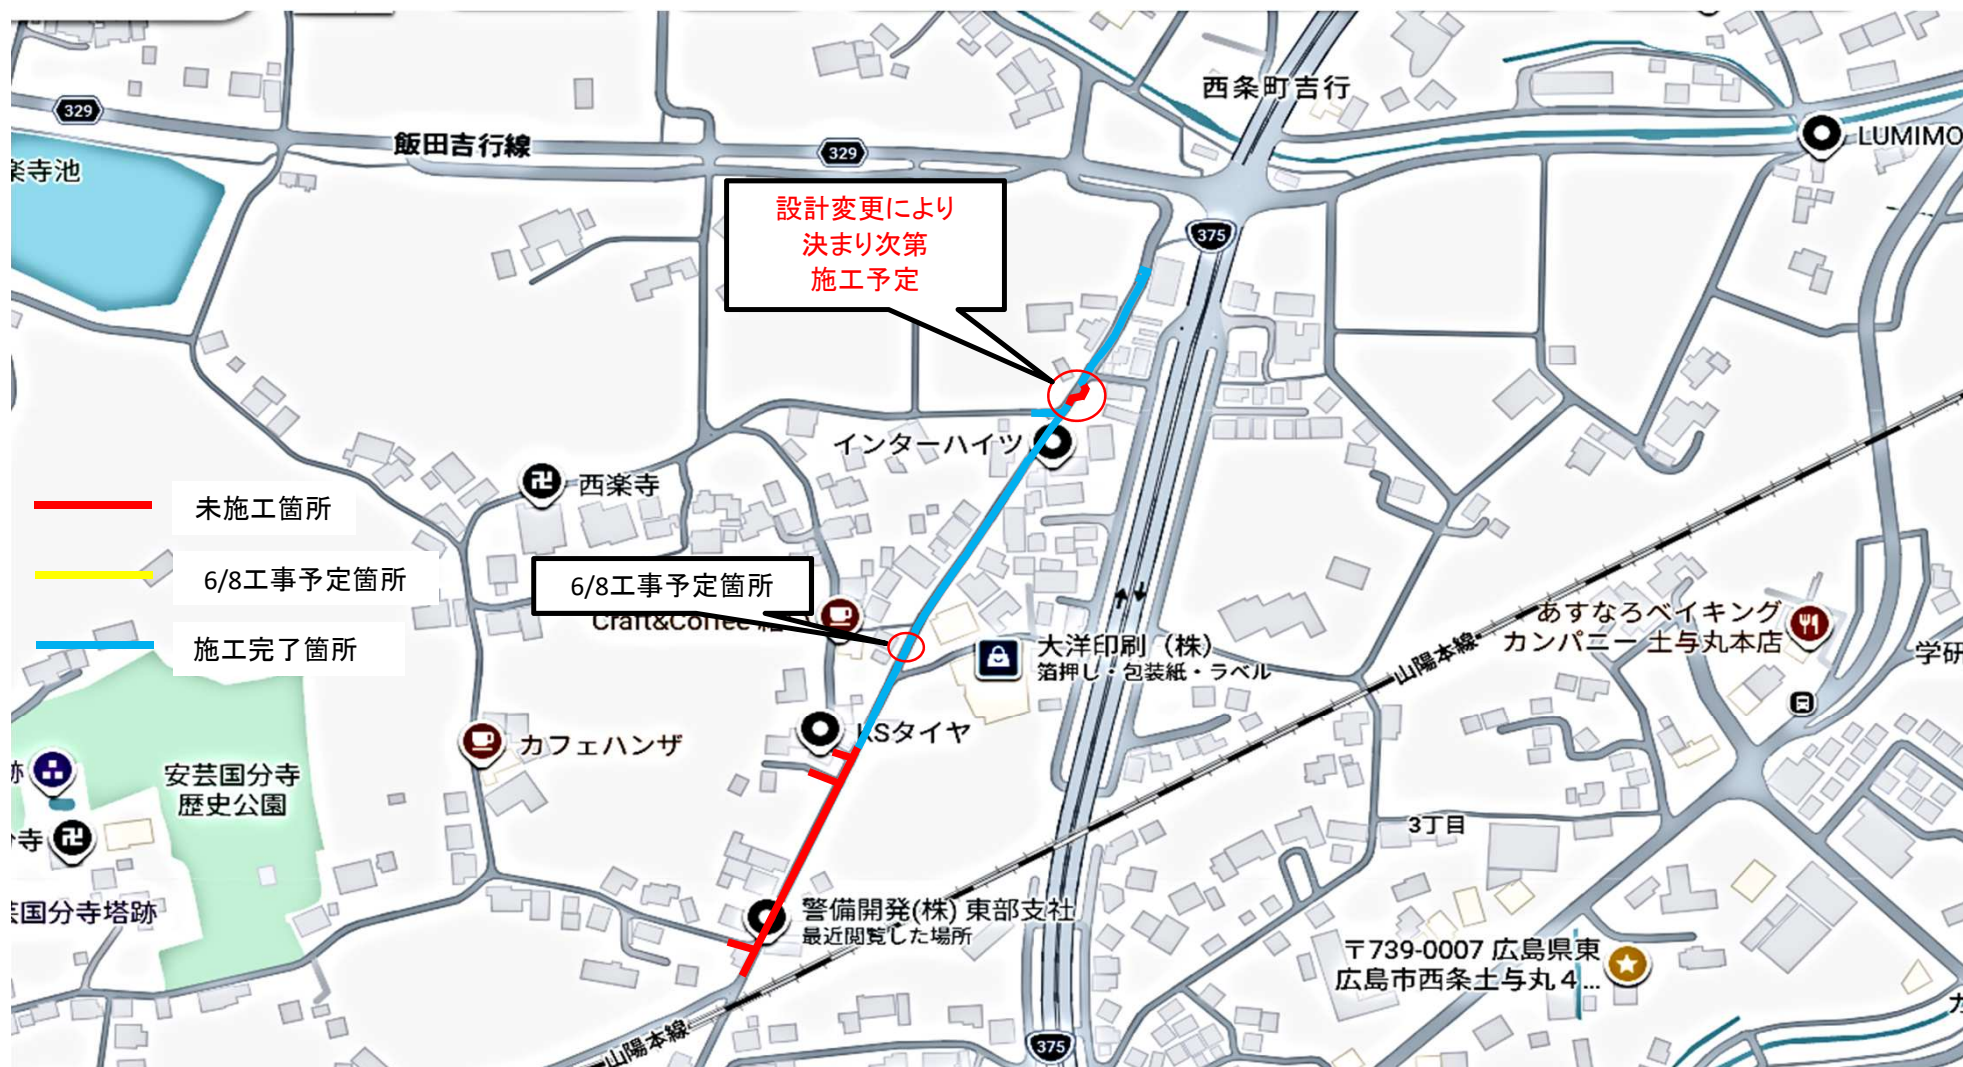

配水管布設工 全施工延長約449m

6/5現在 施工完了延長 286.25m

配水管布設工進捗率63.8%

6月8日工事規制範囲

