


土与丸(是石)地区ほか配水管布設替工事施工箇所



配水管布設工箇所概略図

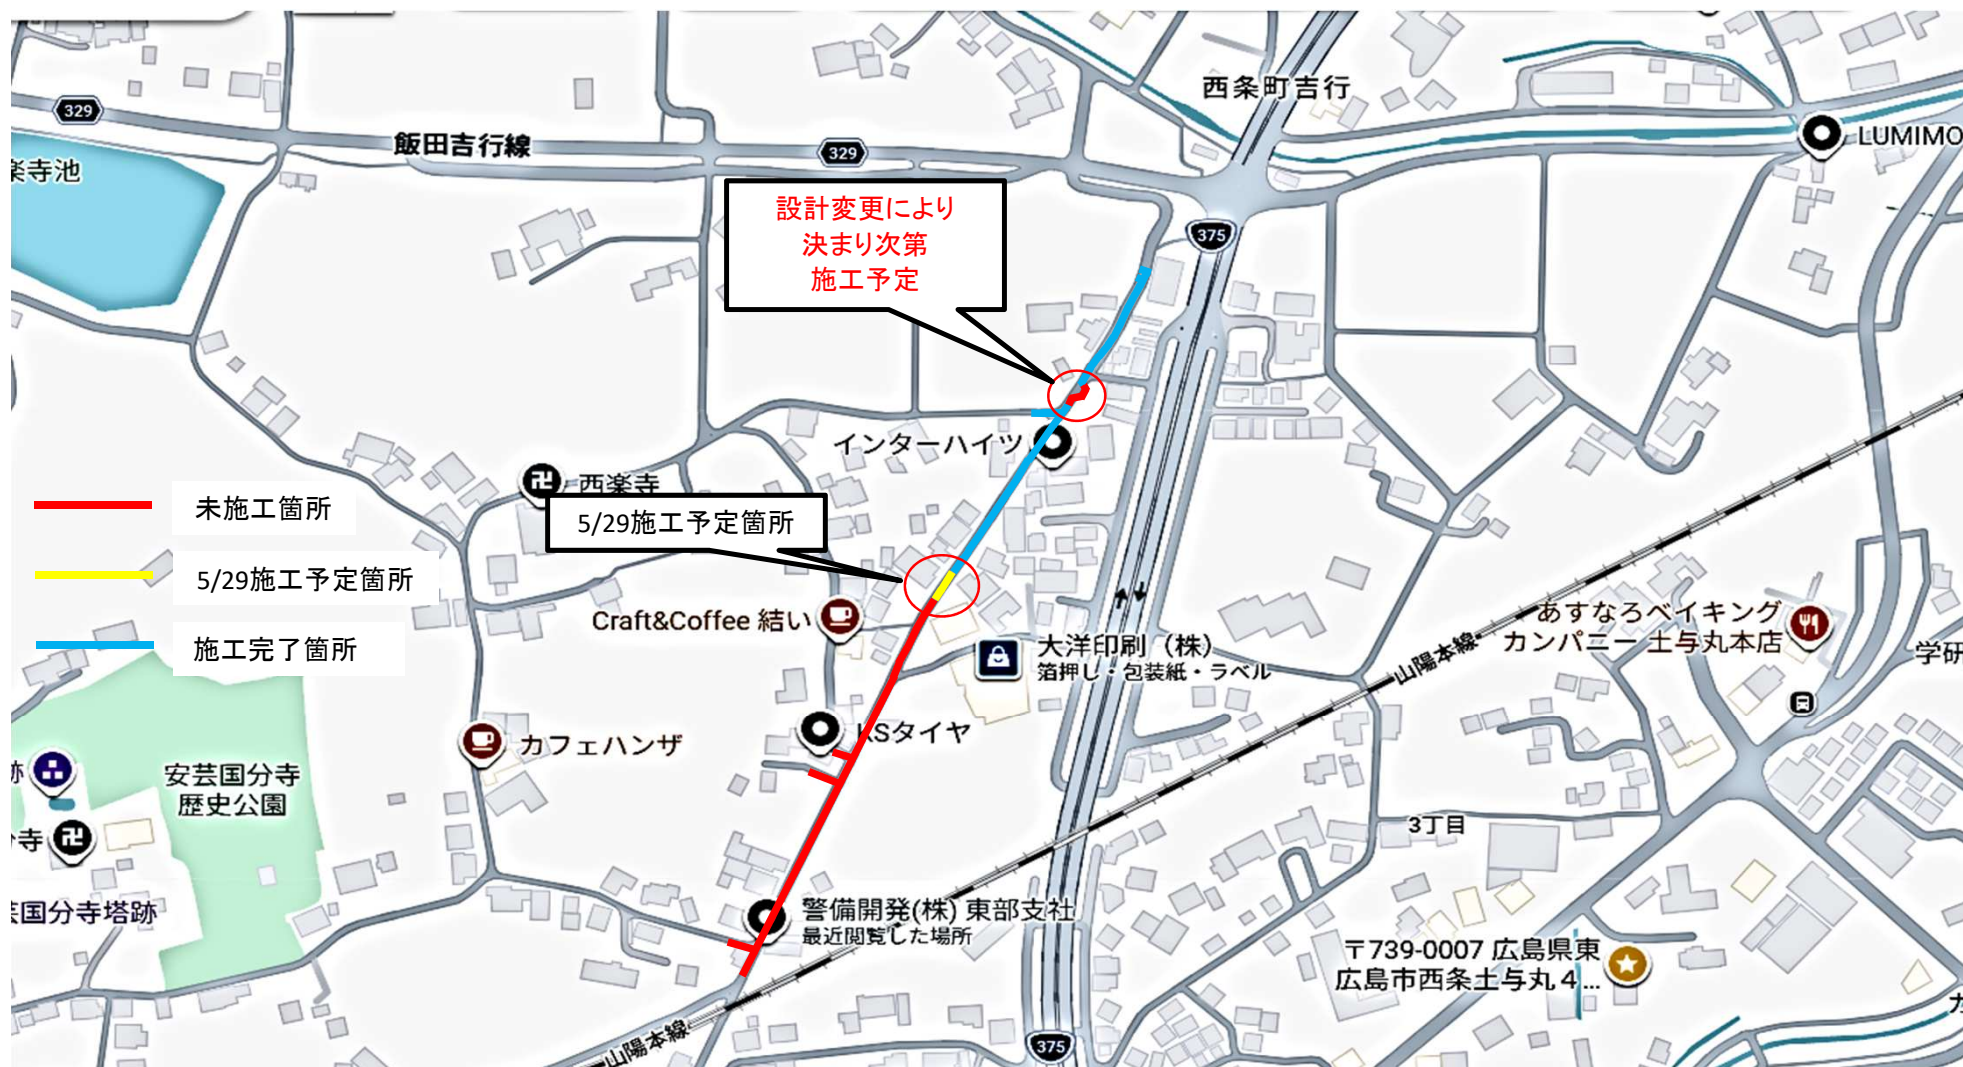

配水管布設工 全施工延長約449m

5/28現在 施工完了延長 179.4m

配水管布設工進捗率40.0%

5月29日工事規制範囲



- 警備員配置予定箇所
- 工事通行止規制範囲
- - - 迂回路
- - - 大型車の通行は、こちらのルートへのご協力をお願いいたします(くら寿司方向からでは、朝の7時~9時は右折できません)
