


土与丸(是石)地区ほか配水管布設替工事施工箇所



撤去・連絡工箇所概略図

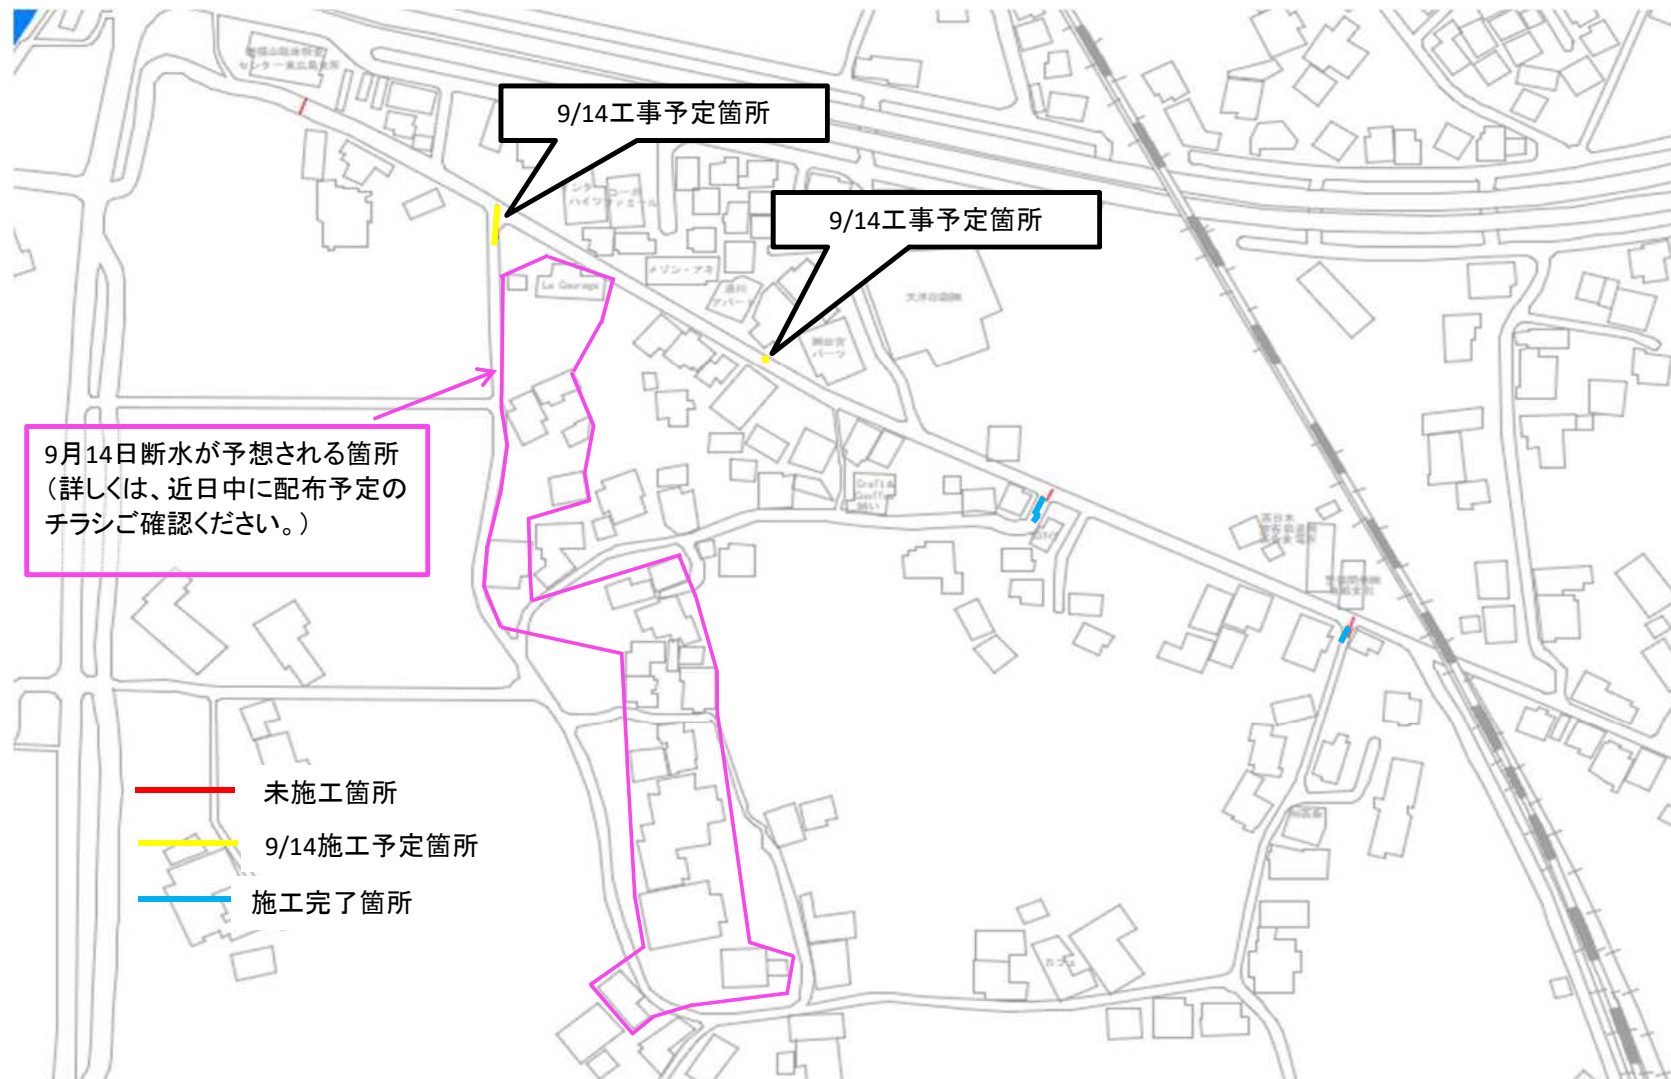

撤去・連絡工箇所 7箇所

完了箇所 2箇所

撤去・連絡工進捗率28.6%

9月14日工事規制範囲



- 警備員配置予定箇所
- 工事通行止規制範囲
- - - 迂回路
- - - 中型車両をご利用の方につきましては、目的地に応じて通行可能なルートをご選択いただきますよう、ご協力をお願いいたします。(くら寿司方向からは、朝の7時～9時は右折できません)
