


土与丸(是石)地区ほか配水管布設替工事施工箇所



配水管布設工箇所概略図

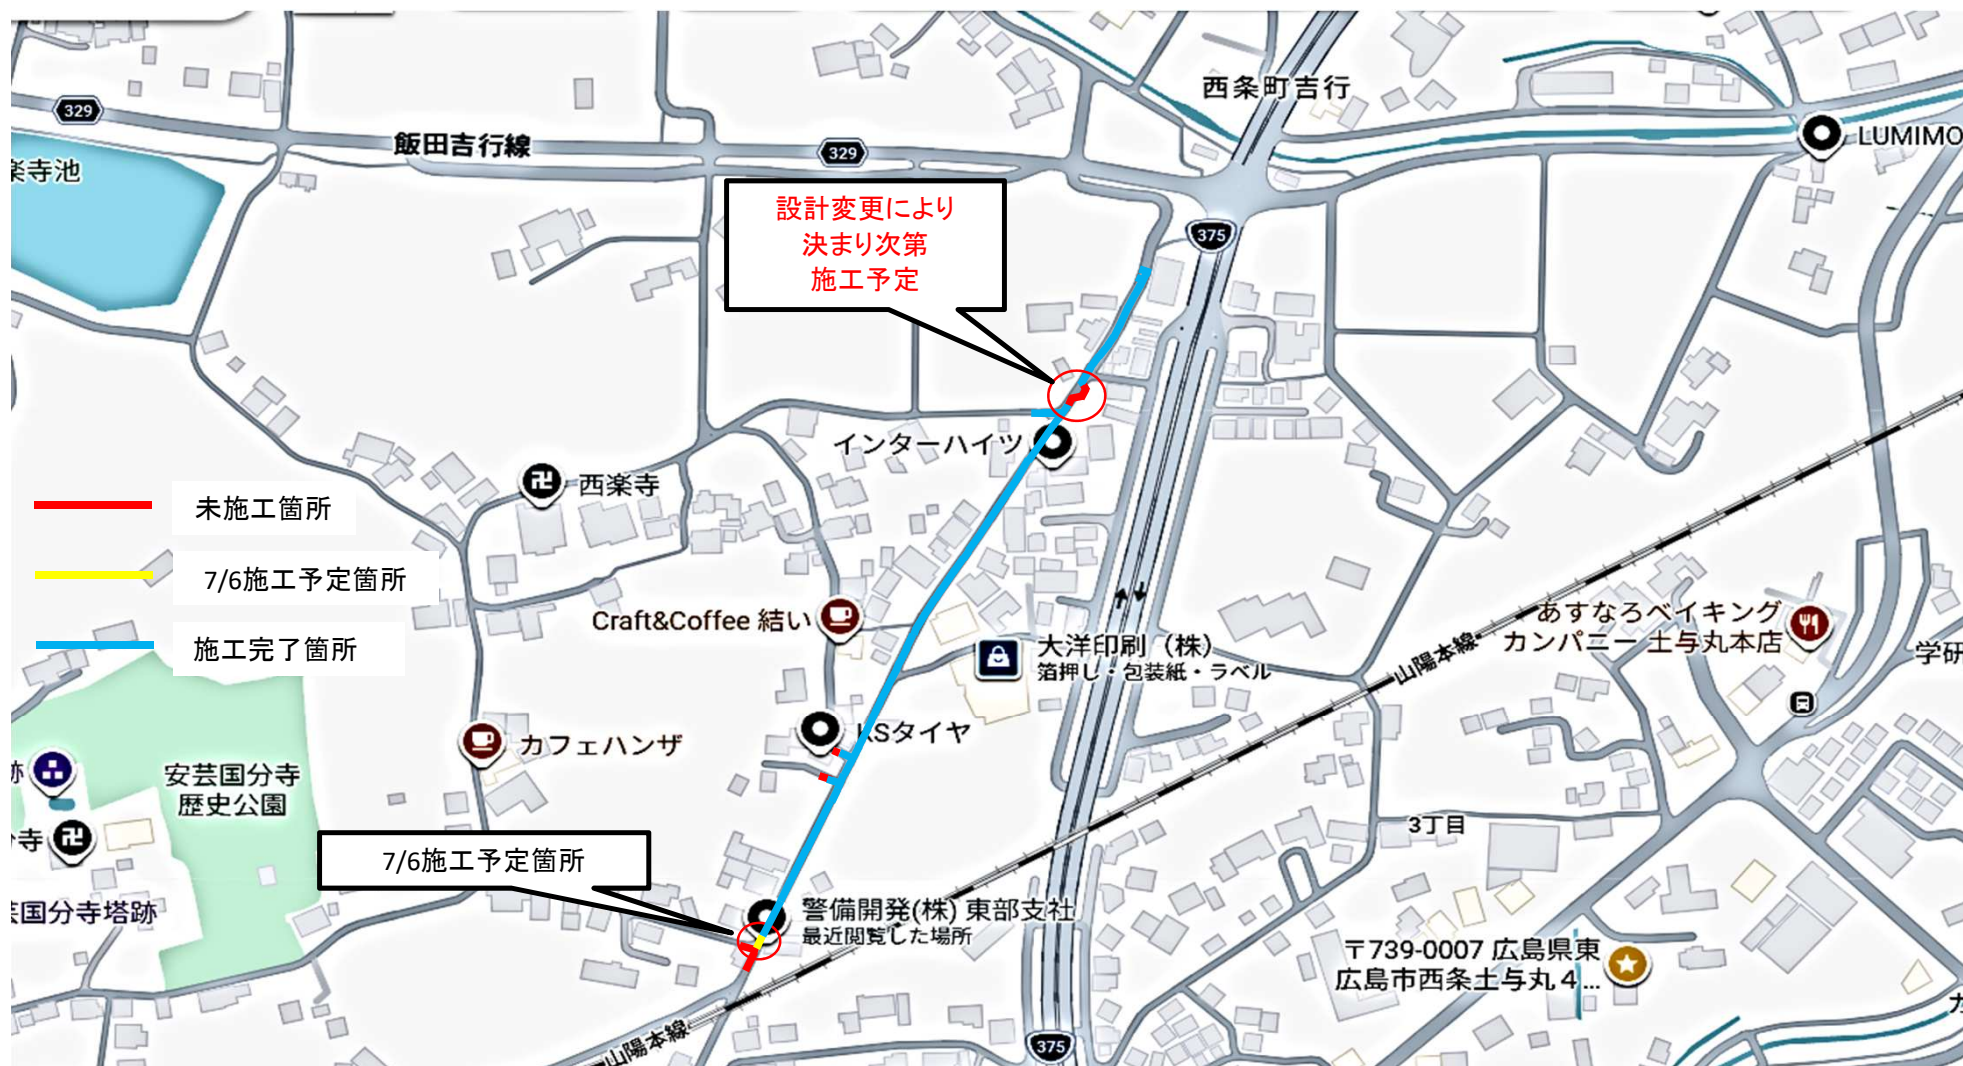

配水管布設工 全施工延長約449m

6/29現在 施工完了延長 406.88m

配水管布設工進捗率90.6%

7月6日工事規制範囲



- 警備員配置予定箇所
- 工事通行止規制範囲
- - - 迂回路
- - - 中型車両をご利用の方につきましては、目的地に応じて通行可能なルートをご選択いただきますよう、ご協力をお願いいたします。
